



**ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**

**REGION: 01 Norte**

**PROGRAMA:** FONDEREG

**EJERCICIO:** 2016

**NOMBRE DEL PROYECTO:** REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

**MUNICIPIO:** MEZQUITIC

**LOCALIDAD:** CABECER MUNICIPAL

**NOMBRE DE LA ACCION:** REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

**MONTO ASIGNADO:** \$2,222,222.22

**DESCRIPCION DE LA OBRA:** TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS , EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, SOBRE ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA EL DESPLANTE DE CAPA SUB RASANTE, FORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA , RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI-60, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE 2 RIEGOS DE LIGA CON EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO, CONSTRUCCIÓN DE CARPETA A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO 3-A A, REENCARPETAMIENTO A BASE DE DOS RIEGOS DE SELLO 3-A A, CONSTRUCCION DE BANQUETA A BASE DE CONCRETO F'C= 200, CONSTRUCCION DE GUARNICION ACABADO APARENTE, SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PALMERA REAL CUBANA DE 20 CM DE DIÁMETRO, VIALETAS DH-1 RETRORREFLEJANTES EN AMBAS CARAS SOBRE EL PAVIMENTO CADA 15 CMS EN CURVA Y 30 M EN TANGENTE, SEÑAL RESTRICTIVA SR-11A, CON UN TABLERO DE 86CM X 86 CM, SEÑAL INFORMATIVA DE DESTINO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOYA DE POLIETILENO CON SISTEMA REFLEJANTE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN MARCAS DE RAYA BLANCA Y AMARILLA,

Fecha de Inicio: 01 de Agosto de 2016

Fecha de Termino Real:

Metas Proyectadas: 4,802 m<sup>2</sup>

Metas Alcanzadas:

Beneficiarios Directos: 2,298

Beneficiarios Indirectos: 15,674

AVANCE	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	0%	0%	15%	15%	10%	10%	10%	10%					70%
Financiero	0%	0%	25%	0%	25%	0%	10%	10%					70%

**DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO:**

TRABAJOS EJECUTADOS DE TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, DESPALME DE TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS , EXCAVACION PARA APERTURA DE CAJA, SOBRE ACARREO DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, COMPACTACIÓN DEL TERRENO NATURAL PARA EL DESPLANTE DE CAPA SUB RASANTE, FORMACION Y COMPACTACIÓN DE LA CAPA SUBRASANTE, CONSTRUCCIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, CIMBRADO Y COLADO DE MACHUELOS Y BANQUETAS.

**DESCRIPCIÓN DEL GASTOS DE AVANCE FINANCIERO:**

GASTOS GENERADOS PARA EL PAGO DE NOMINAS , PAGO DE MATERIAL, PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA Y COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA..

Situación de la Obra: No Iniciada ( ) Terminada sin Operar: ( )  
En Proceso ( x ) Terminada y Operando: ( )  
Suspendida ( )

**OBSERVACIONES:**

GOBIERNO DEL ESTADO- Región 01 Norte  
C. Rafael González Hernández  
Coordinador A

Lic. Maricela Meza Guardado

Analista Especializado

Encargado de supervisar  
físicamente la obra

AYUNTAMIENTO DE  
GOBIERNO  
MUNICIPAL



Nombre: Fidel Salazar García

Cargo Director de Obras Públicas

Fecha del reporte a 1 de Noviembre de 2016



PLANEACIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS

SUB SECRETARIA DE PLANEACION  
DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA  
PROGRAMA FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 2016

REGION 01 NORTE  
CEDULA DE SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE OBRA

PROGRAMA: **FONDEREG**

EJERCICIO: Fondereg 2016

NOMBRE DEL PROYECTO: REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.


MUNICIPIO: MEZQUITIC LOCALIDAD: CABECERA MUNICIPAL

NOMBRE DE LA ACCION: REHABILITACION DE ACCESO PRINCIPAL DE CARPETA ASFALTICA, CONSTRUCCION DE MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

MONTO ASIGNADO: \$2,222,222.22


ANTES

INICIO

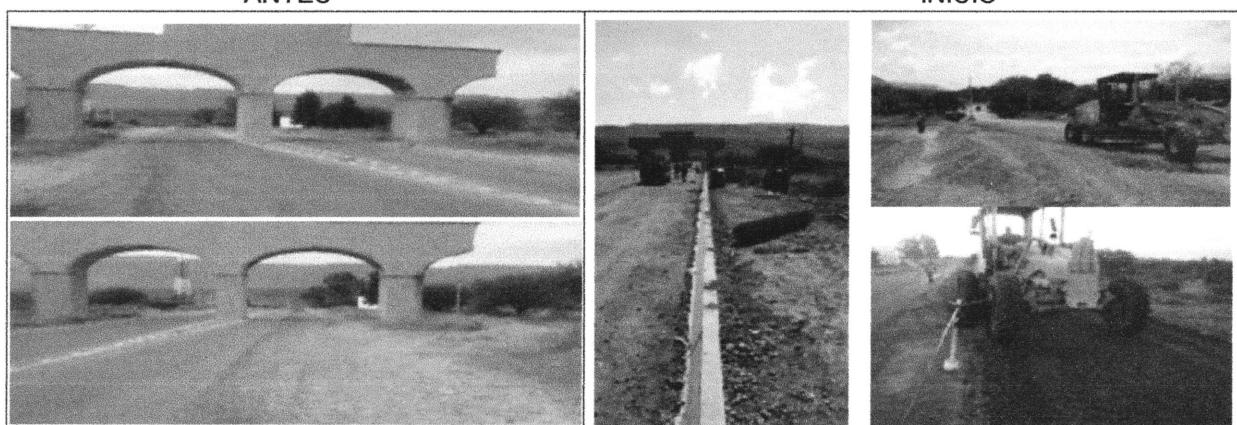

PROCESO

FINAL

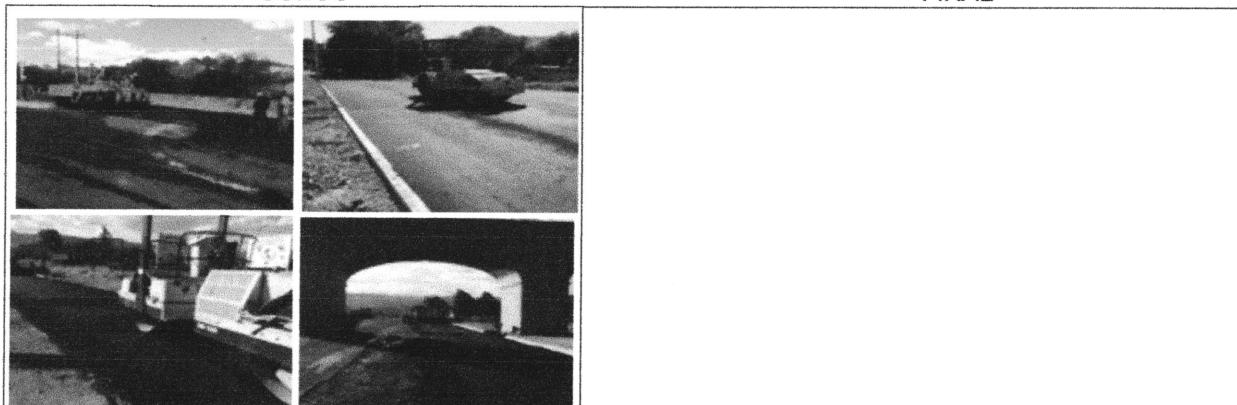

GOBIERNO DEL ESTADO: Región 01 Norte

Lic. Maricela Meza Guardado

Analista Especializado

Encargado de supervisar físicamente la obra

Fecha del reporte

a 1 de

Noviembre de 2016

GOBIERNO MUNICIPAL

Rafael González Hernández

Coordinador A



Nombre  
Fidel Salazar García

Cargo

Director de Obras Públicas
