

ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO

REGION:  
PROGRAMA: FONDEREG  
EJERCICIO: 2015  
NOMBRE DEL PROYECTO: CONSTRUCCION DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.  
MUNICIPIO: MEZQUITIC LOCALIDAD: TOTUATE  
NOMBRE DE LA ACCION: CONSTRUCCION DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE.  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.  
MONTO ASIGNADO: 2'197,530.87 (DOS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS  
TREINTA PESOS 87/100 M.N.)

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	construccion de cimentacion a base de mamposteria, relleno con material de banco y compactado con vibro compactador.
relleno:	compactacion de material mejorado, excavacion y construccion de muro de mamposteria
	1.60x2x40, tendido de parrilla armada y anclada a castillos con varilla de 3/8", concreto hidraulico de 250 kg/cm2, para construccion de calzada pavimentada y postes de concreto armado ,indicadores de nivel de agua.

Fecha de Inicio: 11 DE NOVIEMBRE 2015 Fecha de Termino Real: 23 DE MARZO DE 2016  
Metas Proyectadas: 415 m2 Metas Alcanzadas: 913 m2  
Beneficiarios Directos: 130 Beneficiarios Indirectos: 385


AVANCE	NOVIEMBRE		DICIEMBRE		ENERO		FEBRERO		MARZO		TOTAL
	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	1°	2°	
Físico	15%	25%	30%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%
Financiero	15%	25%	30%	0%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	100%


DESCRIPCIÓN DE AVANCE FÍSICO:  
Trabajos de construccion de mamposteria, colocacion de tuberia, relleno con material de banco, afine y colado de losa de concreto, acabado y limpieza al final de la obra.

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE FINANCIERO:  
Pago materiales, renta de maquinaria, de combustible y mano de obra.

Situación de la Obra: No Iniciada ( ) Terminada sin Operar: ( )  
En Proceso ( ) Terminada y Operando: ( x )  
Suspendida ( )

OBSERVACIONES: Requiere de mantenimiento constante en cuestion de desasolve de tuberia en el cause del rio Bolaños.

GOBIERNO DEL ESTADO  
  
Lic. Maricela Meza Guardado  
Tecnico Especializado A  
Coord. de Gestión Regional 01 Norte

GOBIERNO MUNICIPAL  
  
Fidel Salazar Garcia  
Director de Obras Públicas



Fecha del reporte a 23 de Marzo de 2016

*Handwritten notes:*  
Baldi  
11/09/16  




Secretaría de Planeación  
Administración y Finanzas  
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

Subsecretaría de planeación y evaluación  
Dirección general de inversión pública  
**FONDEREG 2015**

**ANEXO 4. CÉDULA DE SUPERVISIÓN DE OBRA E  
INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO**


REGION:  
PROGRAMA: **FONDEREG**  
EJERCICIO: **2015**  
NOMBRE DEL PROYECTO: **CONSTRUCCION DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE  
MUNICIPIO DE MEZQUITIC, JALISCO.**

MUNICIPIO: **MEZQUITIC** LOCALIDAD: **TOTUATE**  
NOMBRE DE LA ACCION: **CONSTRUCCION DE VADO, EN LA LOCALIDAD DE TOTUATE, MUNICIPIO DE  
MEZQUITIC, JALISCO**

MONTO ASIGNADO: **2'197,530.87**



**ANTES**

**INICIO**

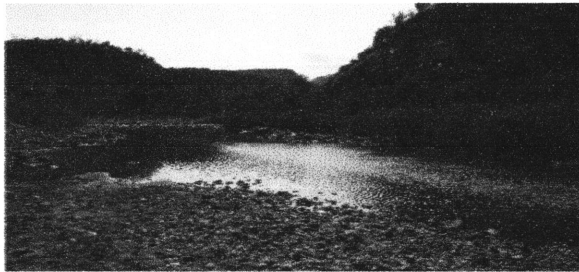

**PROCESO**

**FINAL**

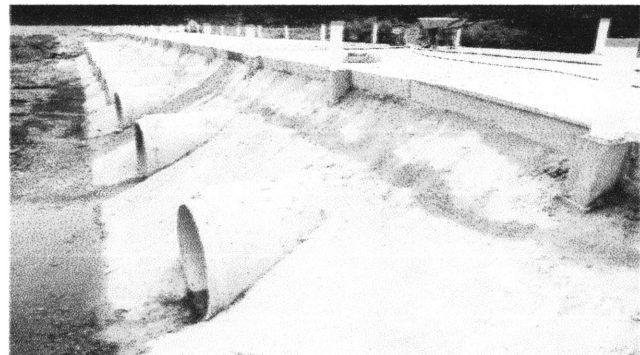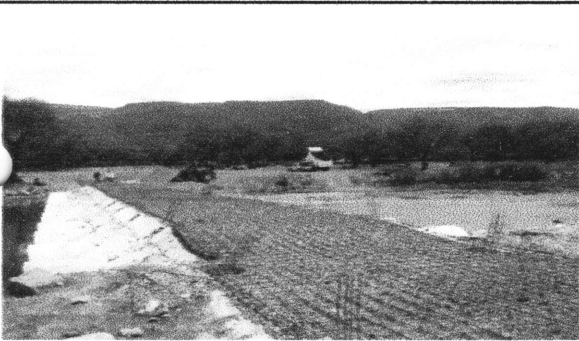

GOBIERNO DEL ESTADO  
REGIÓN No.

*Maricela Meza Guardado*

**Lic. Maricela Meza Guardado**  
**Tecnico Especializado A**  
**Coord. de Gestión Regional 01**

GOBIERNO MUNICIPAL

*Fidel Salazar Garcia*

**Fidel Salazar Garcia**  
**Director de Obras Públicas**



Fecha de reporte a 23 de Marzo de 2016
